
(подпись)

15.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(I5-38) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом	Единица	9	0	0	21	30	29	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.
2		Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0.126	0	0	693	1931	1.889	100,00%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклоненийСведения не
представленыПрогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%	85 347,00	85 346,95	85 346,95	85 346,95	85 346,95	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	85 347,00	85 346,95	85 346,95	85 346,95	85 346,95	100,00	Средства направлены в полном объеме
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	85 347,00	85 346,95	85 346,95	85 346,95	85 346,95	100,00	Средства направлены в полном объеме
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(06) Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	100,00	Денежные средства перечислены в полном объеме
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	44 505,70	100,00	Денежные средства перечислены в полном объеме
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(06) Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц	33 196,60	32 966,63	32 966,63	0,00	32 966,63	100,00	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	33 196,60	32 966,63	32 966,63	0,00	32 966,63	100,00	денежные средства за счет федерального, областного и местного бюджета израсходованы в полном объеме. По технической ошибке средства муниципального образования город Железнодорожск в сумме 0,2 млн.рублей не учли в ЛБО,СБР и кассовом исполнении
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 196,60	32 966,63	32 966,63	0,00	32 966,63	100,00	денежные средства перечислены в полном объеме



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2		внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			163 049,30	162 819,28	162 819,28	129 852,65	162 819,28	99,86	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			163 049,30	162 819,28	162 819,28	129 852,65	162 819,28	99,86	
бюджет субъекта Российской Федерации			163 049,30	162 819,28	162 819,28	129 852,65	162 819,28	99,86	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году	
2		Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц	
3		Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%	

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 3, на дату	20.12.2019	20.12.2019	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			20.12.2019				
1.1			С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.12.2019	14.08.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 14.08.2019г. № 6, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 30.05.2019г. № 3, приложен файл. 3. "Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 04.06.2019г. № 4, приложен файл. Заключено соглашение между комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на организацию деятельности Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	20.12.2019	14.08.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 30.05.2019г. № 3, приложен файл. 2. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 04.06.2019г. № 4, приложен файл. 3. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 14.08.2019г. № 6, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл. Привлечены средства федерального бюджета на организацию деятельности Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"
1.2.1	РРП		Обеспечена деятельность центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки МСП на одной площадке и оказывающего комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл.
1.3	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.3.1	РРП		Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес»	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2			Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% Значение: 4, на дату 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.
2.1.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на организацию деятельности Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.
3			<i>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц. Значение: 14, на дату 20.12.2019</i>	20.12.2019	20.12.2019	Котов Д. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о получателях бюджетных средств по итогам 2019 года" Отчет Администрации моногорода Железнодорожского от 23.12.2019г. №Е/09/31-1497, приложен файл. Предоставлена информация : 27 из 14. Информация по результату: В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информация о получателях бюджетных средств по итогам 2019 года" Отчет Администрации моногорода Железнодорожского от 23.12.2019г. №Е/09/31-1497, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Котов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о получателях бюджетных средств по итогам 2019 года" Отчет Администрации моногорода Железнодорожска от 20.12.2019г. №Е/09/31-1497, приложен файл.
3.1.1	РРП		Субъектам малого и среднего предпринимательства моногорода Железнодорожска предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий	20.12.2019	20.12.2019	Котов Д. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о получателях бюджетных средств по итогам 2019 года" Отчет Администрации моногорода Железнодорожска от 20.12.2019г. №Е/09/31-1497, приложен файл.
3.2	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл.
3.2.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на софинансирование муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства моногорода Железнодорожска	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	28.03.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 28.03.2019г. № 38705000-1-2019-006, приложен файл.
3.3.1	РРП		Предоставлены субсидии Администрации моногорода Железногорска на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства	20.12.2019	28.03.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 28.03.2019г. № 38705000-1-2019-006, приложен файл.
4			<i>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц Значение: 2, на дату 20.12.2020</i>	20.12.2020	20.12.2020	Котов Д. В.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 2 из 2. Информация по результату: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информация о получателях бюджетных средств по итогам 2019 года" Отчет Администрации моногорода Железногорска от 23.12.2019г. №Е/09/31-1497, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.
4.1.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на софинансирование муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпринимательства моногорода Железнодорожска	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году Значение: 0.029, на дату 20.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Предоставлена информация : 0.03 из 0.029. Информация по результату: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.
5.1.1	РРП		Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре поддержки экспорта	20.12.2019	20.12.2019	Ильинова О. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл.
5.2	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	20.12.2019	27.05.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 27.05.2019г. № 2, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на организацию деятельности Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	20.12.2019	27.05.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением - Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»" Соглашение комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области от 27.05.2019г. № 2, приложен файл.
5.3	РРП		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл.
5.3.1	РРП		Обеспечен доступ субъектов МСП к государственным мерам поддержки экспорта, осуществляет свою деятельность Центр поддержки Курской области	20.12.2019	12.02.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации" Соглашение Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.02.2019г. №139-09-2019-217, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году Значение: 0.055, на дату 20.12.2020	20.12.2020	20.12.2020	Аксёнов М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0.055 из 0.055. Информация по результату: В работе.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» по состоянию на 19.12.2019" Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» от 19.12.2019г. №849, приложен файл. Выполнено

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.1	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.
6.1.1	РРП		Привлечены средства федерального бюджета на организацию деятельности Ассоциации МКК "ЦПП Курской области"	15.02.2020	25.12.2019	Аксёнов М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12.02.2019 № 139-09-2019-217" Соглашение Администрации Курской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-217/3, приложен файл.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

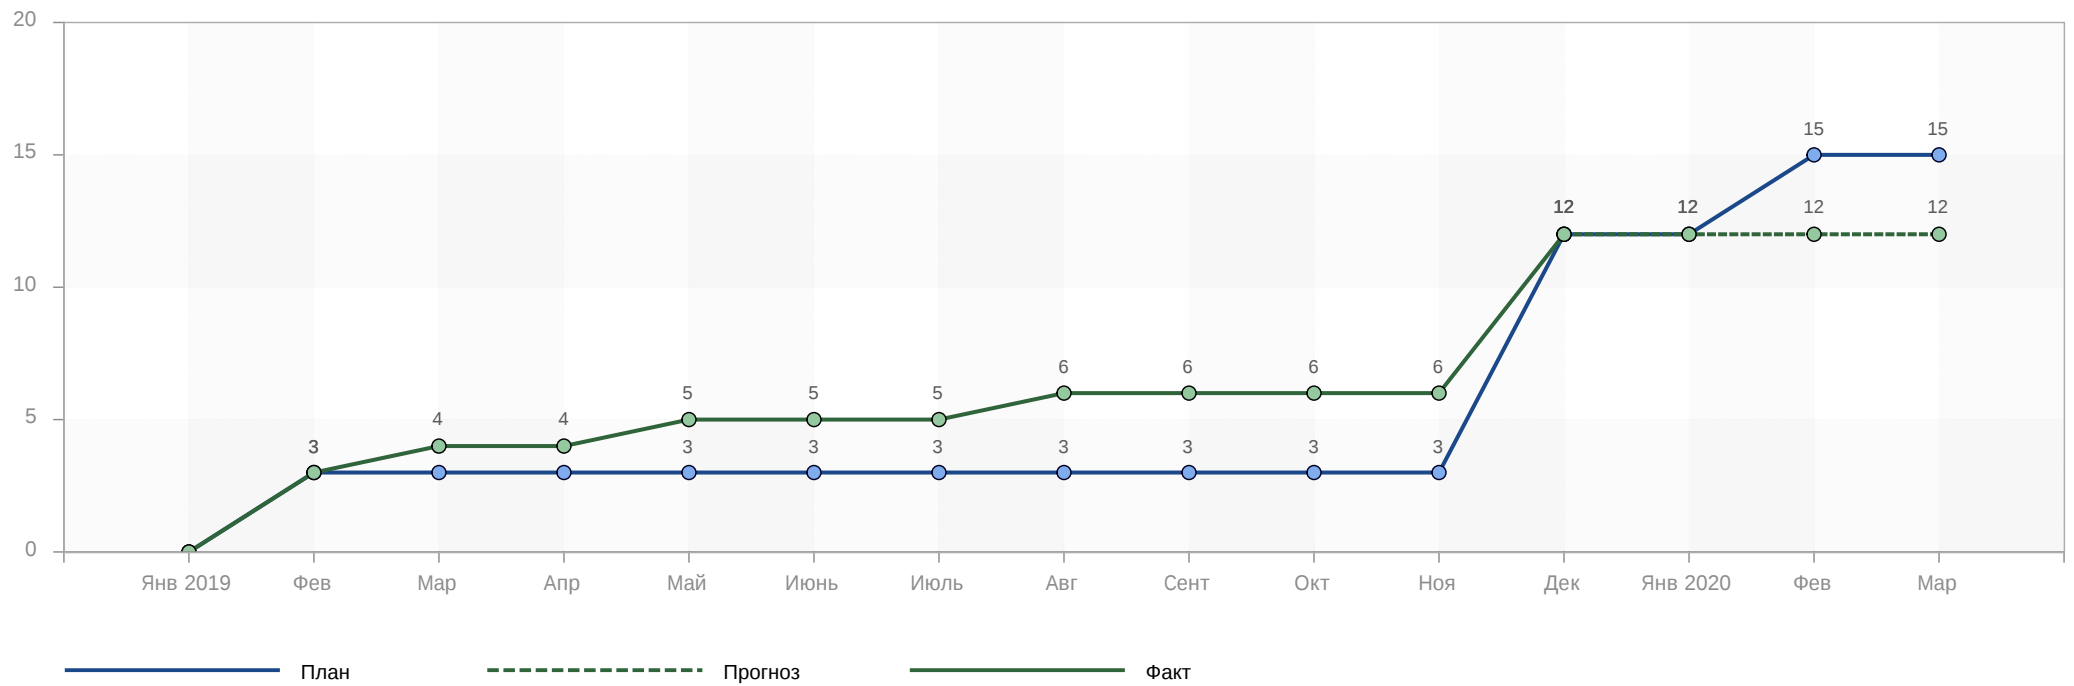


Рис. 1. "(I5-38) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

График достижения показателя

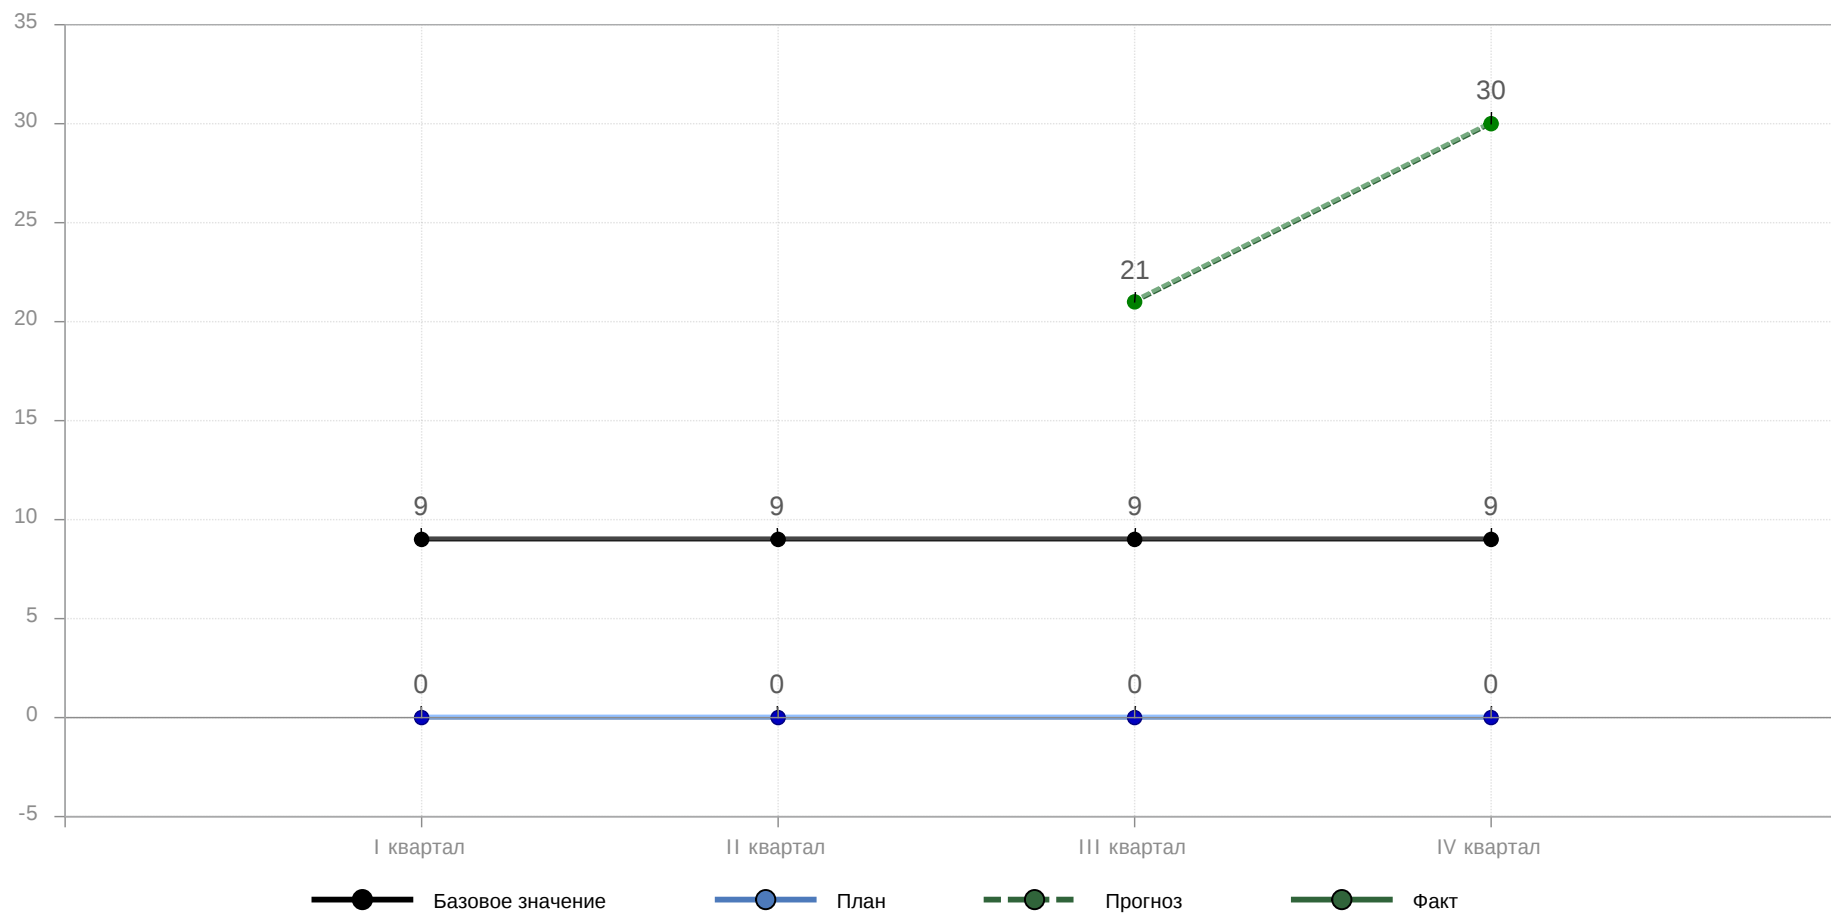


Рис. 1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

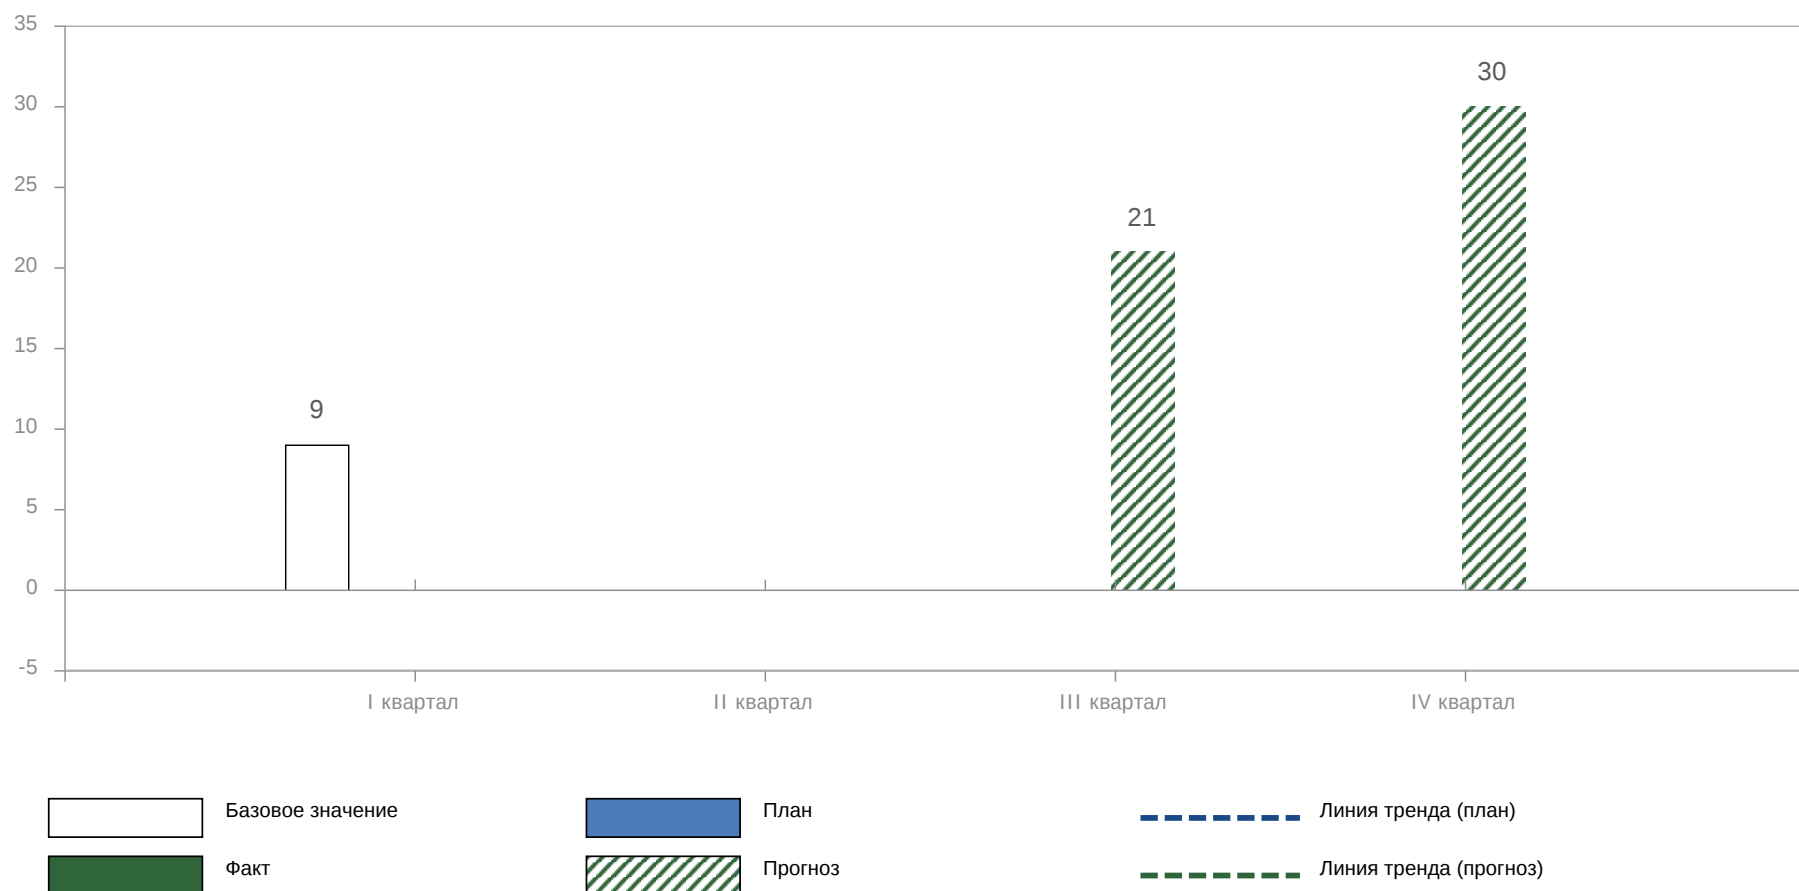


Рис. 2. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

График достижения показателя

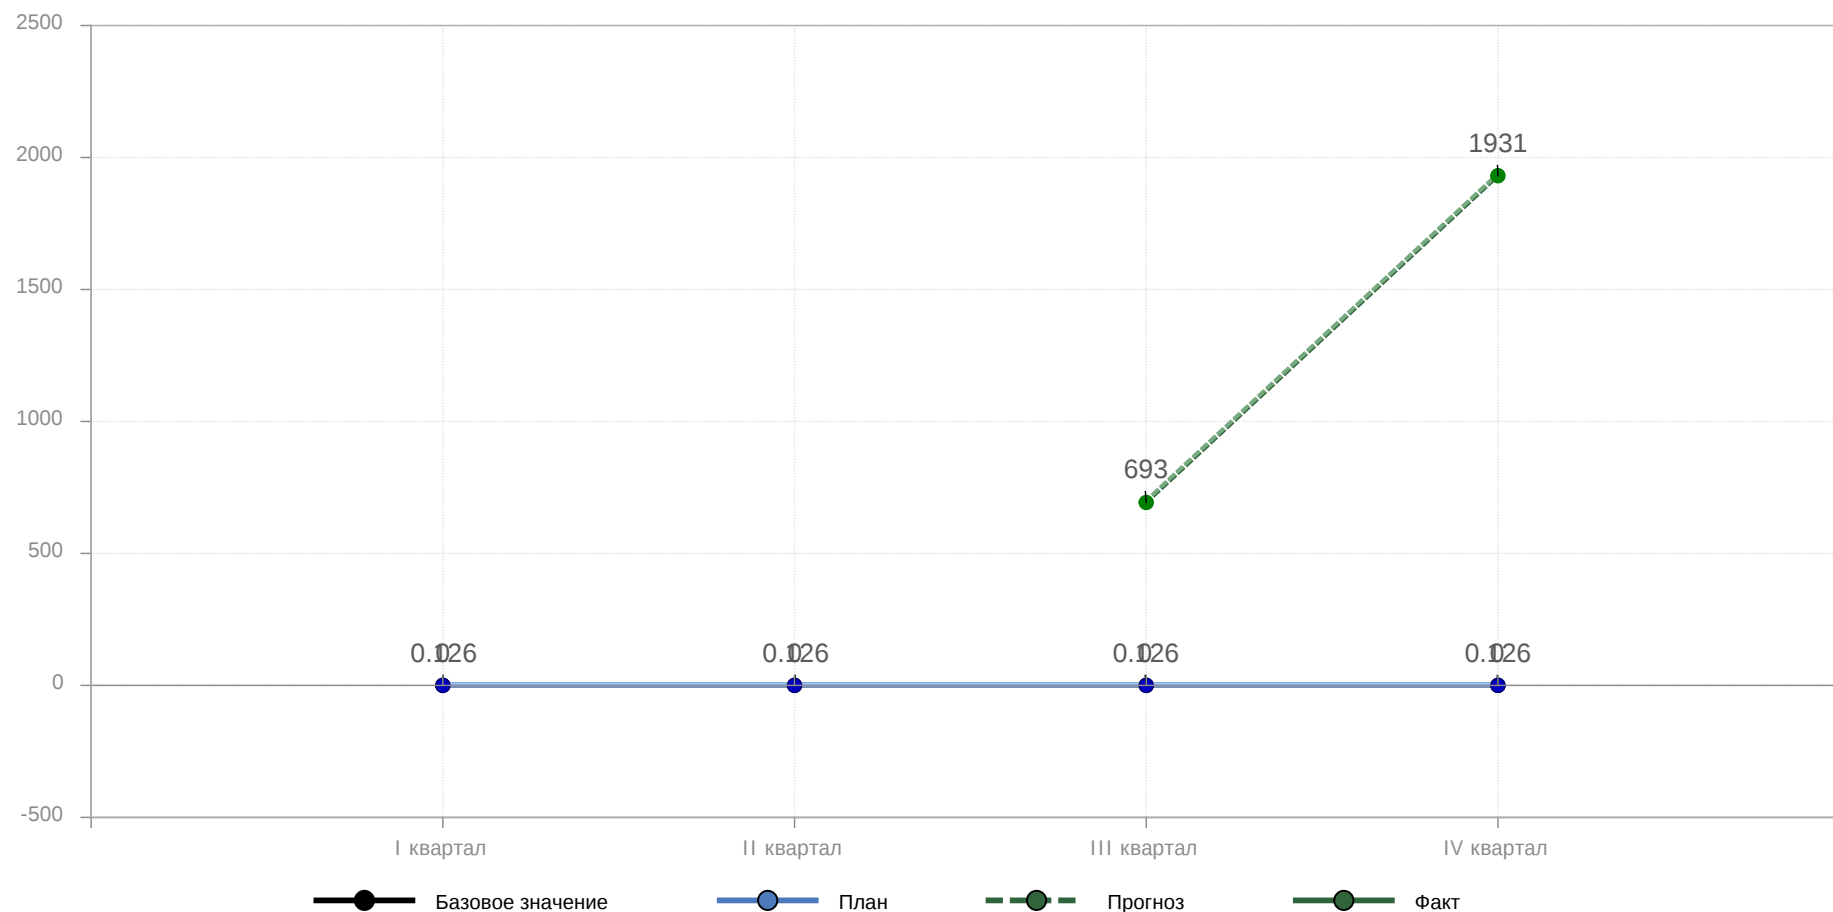


Рис. 3. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, нарастающим итогом

Диаграмма достижения показателя

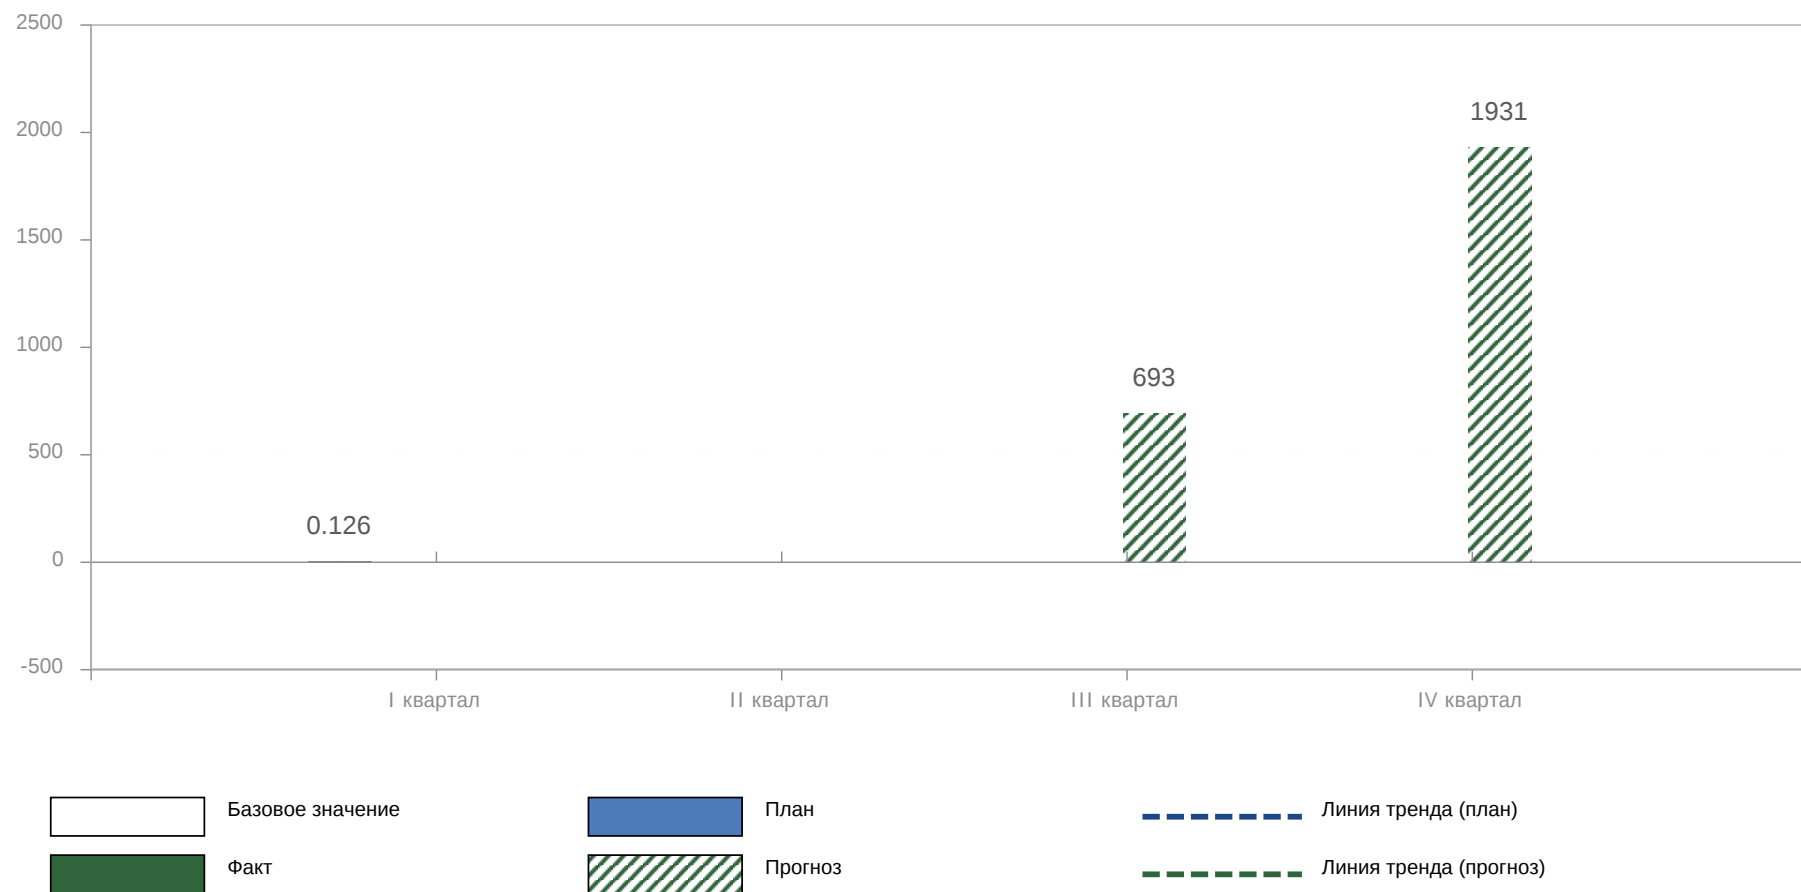


Рис. 4. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках регионального проекта, нарастающим итогом
